

令和4年5月下旬から新校舎の工事に着手します。

昨年末に完了した基本設計をもとに進めている実施設計（詳細設計）が間もなく完了します。令和4年5月下旬から、いよいよ新校舎建設工事が始まります。



1. 新校舎建設工事について

STEP 1. 事前撤去準備工事

(令和4年5月下旬～7月予定)

初めにグラウンドのバックネット、防球ネット、植栽等の撤去に着手します。工事エリアは、仮囲いで区画し安全に工事を進めますが、グラウンドは一部利用制限があります。




- ※上記期間中、現在の正門や武道場横入り口は、これまでどおり使用できます。
- ※工事用車両出入口には、適宜交通誘導員を配置します。
- ※登下校の時間帯に配慮し、安全な工事計画とします。
- ※新校舎の工事期間中も現体育館は、災害時の避難所として使用できます。


STEP 2. 新校舎棟建設工事

(令和4年7月～令和5年11月予定)

続いて、現在のグラウンド側に新校舎を建てます。安全配慮のため、工事エリアは仮囲いで区画し、左記工事と同様に工事車両は専用出入口を利用します。

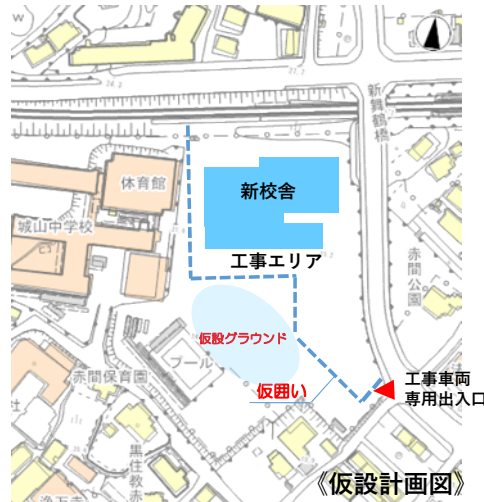

2. 新校舎配置図

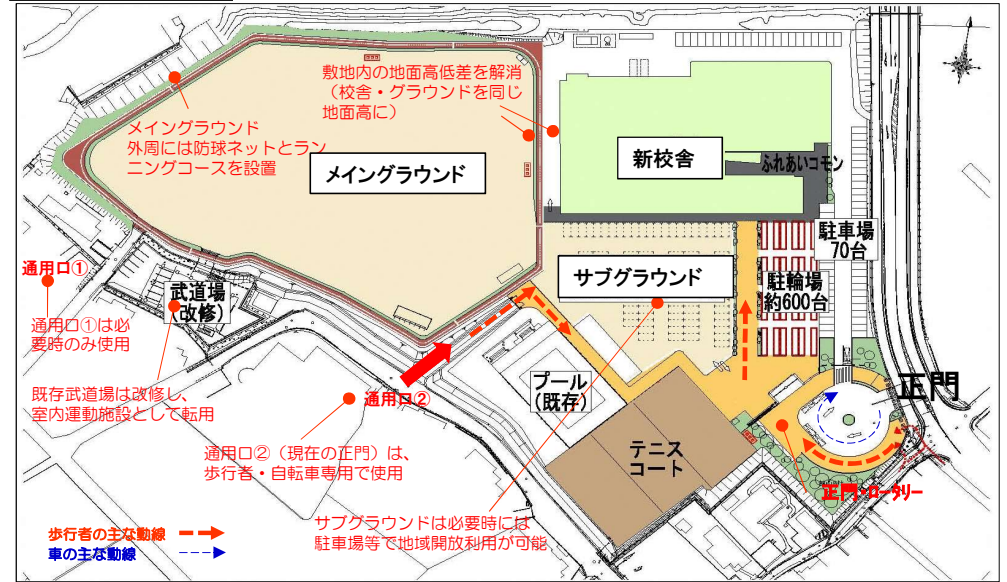

3. 今後のスケジュール

今後の事業スケジュールは以下のとおりです。新校舎については令和4年7月に着工し、令和6年1月頃から供用を開始する予定です。その後、現在の校舎の解体工事及び新しいグラウンド等の整備を行います。事業全体の完了は令和7年度となる見込みです。

工程	令和3(2021)年度	令和4(2022)年度	令和5(2023)年度	令和6(2024)年度	令和7(2025)年度
設計期間	基本設計 6ヶ月	実施設計等 6ヶ月			
校舎建設期間		17ヶ月		新校舎使用開始 (グラウンド等随時使用開始)	
解体期間				9ヶ月	
グラウンド等外構工事期間				擁壁造成等 8ヶ月	グラウンド等 6ヶ月 ローリー等 5ヶ月

現在

事前撤去準備工事

全面使用開始

4. 工事中の部活動や学校活動について

校舎建設工事中は、グラウンドが一部利用できなくなり、屋外での部活動などに影響が出ます。特に「野球部」・「サッカー部」の練習場は、一定の広さが必要なため、学校敷地外で代替場所を確保します。その際、先生・生徒たちの移動は、民間の貸し切りバスを利用し、学校から練習場所まで送迎する予定です。その他体育祭などの学校活動に支障が出る場合も、代替場所を確保します。詳細は、内容が決定次第お知らせいたします。

5. 体育館にも空調設備を整備予定

宗像市では、令和7年度を目標に全ての市立学校体育館に空調設備を整備する予定です。その先駆けとして城山中学校では、校舎建設に併せて体育館に空調設備を設置します。学校体育館空調は、避難所としての利用時や、猛暑時の熱中症対策などにおいて有効な設備として期待できます。

